

■工事概要

建物の構造・規模：鉄筋コンクリート造14階建
 工事期間：2022.6.1~2024.4.30
 設計・施工監理会社：株式会社 竹中工務店 名古屋支店
 施工会社：株式会社 竹中工務店 名古屋支店
 建築確認審査機関：ビューローベリタスジャパン株式会社
 住宅性能評価機関：ビューローベリタスジャパン株式会社

■5月の工事進捗状況


- ・地上躯体工事
- ・地上仕上工事
- ・仮設外部足場組立工事

■5月の行事等

- 5月1日：5階床7通~12通コンクリート打設
- 5月8日：5階床5通~7通コンクリート打設
- 5月11日：5階床3通~5通コンクリート打設
- 5月11日：現場品質巡回
- 5月12日：総合定例会議
- 5月22日：現場品質巡回
- 5月23日：4階床0通~2通コンクリート打設
- 5月24日：6階床7通~12通コンクリート打設
- 5月24日：消防中間検査
- 5月27日：6階床3通~7通コンクリート打設
- 5月31日：1階住戸部間仕切り下地開始

■5月末時点の工事進捗状況

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 14階 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | |
| 13階 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | |
| 12階 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | |
| 11階 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | |
| 10階 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | |
| 9階 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | |
| 8階 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | |
| 7階 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | |
| 6階 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | |
| 5階 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | |
| 4階 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
| 3階 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
| 2階 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 1階 | エントランス | ゴミ庫 | メールコーナー | キッズルーム | ゲストルーム | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 基礎 | [Blue shaded area] | | | | | | | | | | | |
| 杭 | [Blue shaded area] | | | | | | | | | | | |

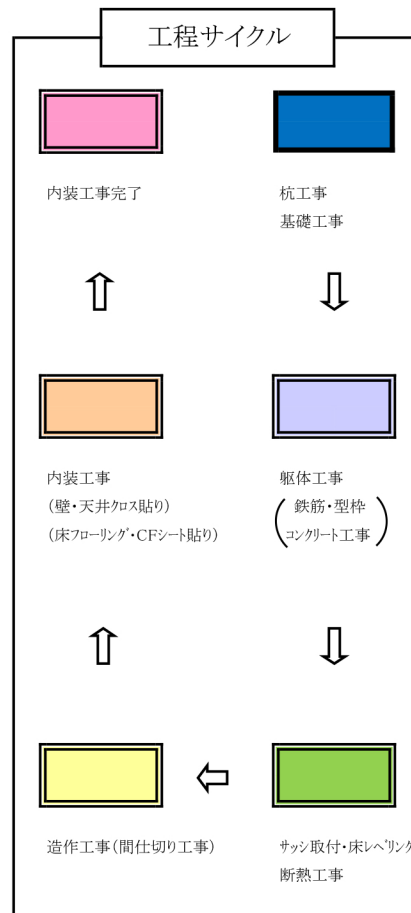

■工事写真

